Tidplan arbeten Brf Tibble
Upprättad datum: 2021-03-30
Uppdaterad datum:2021-09-21
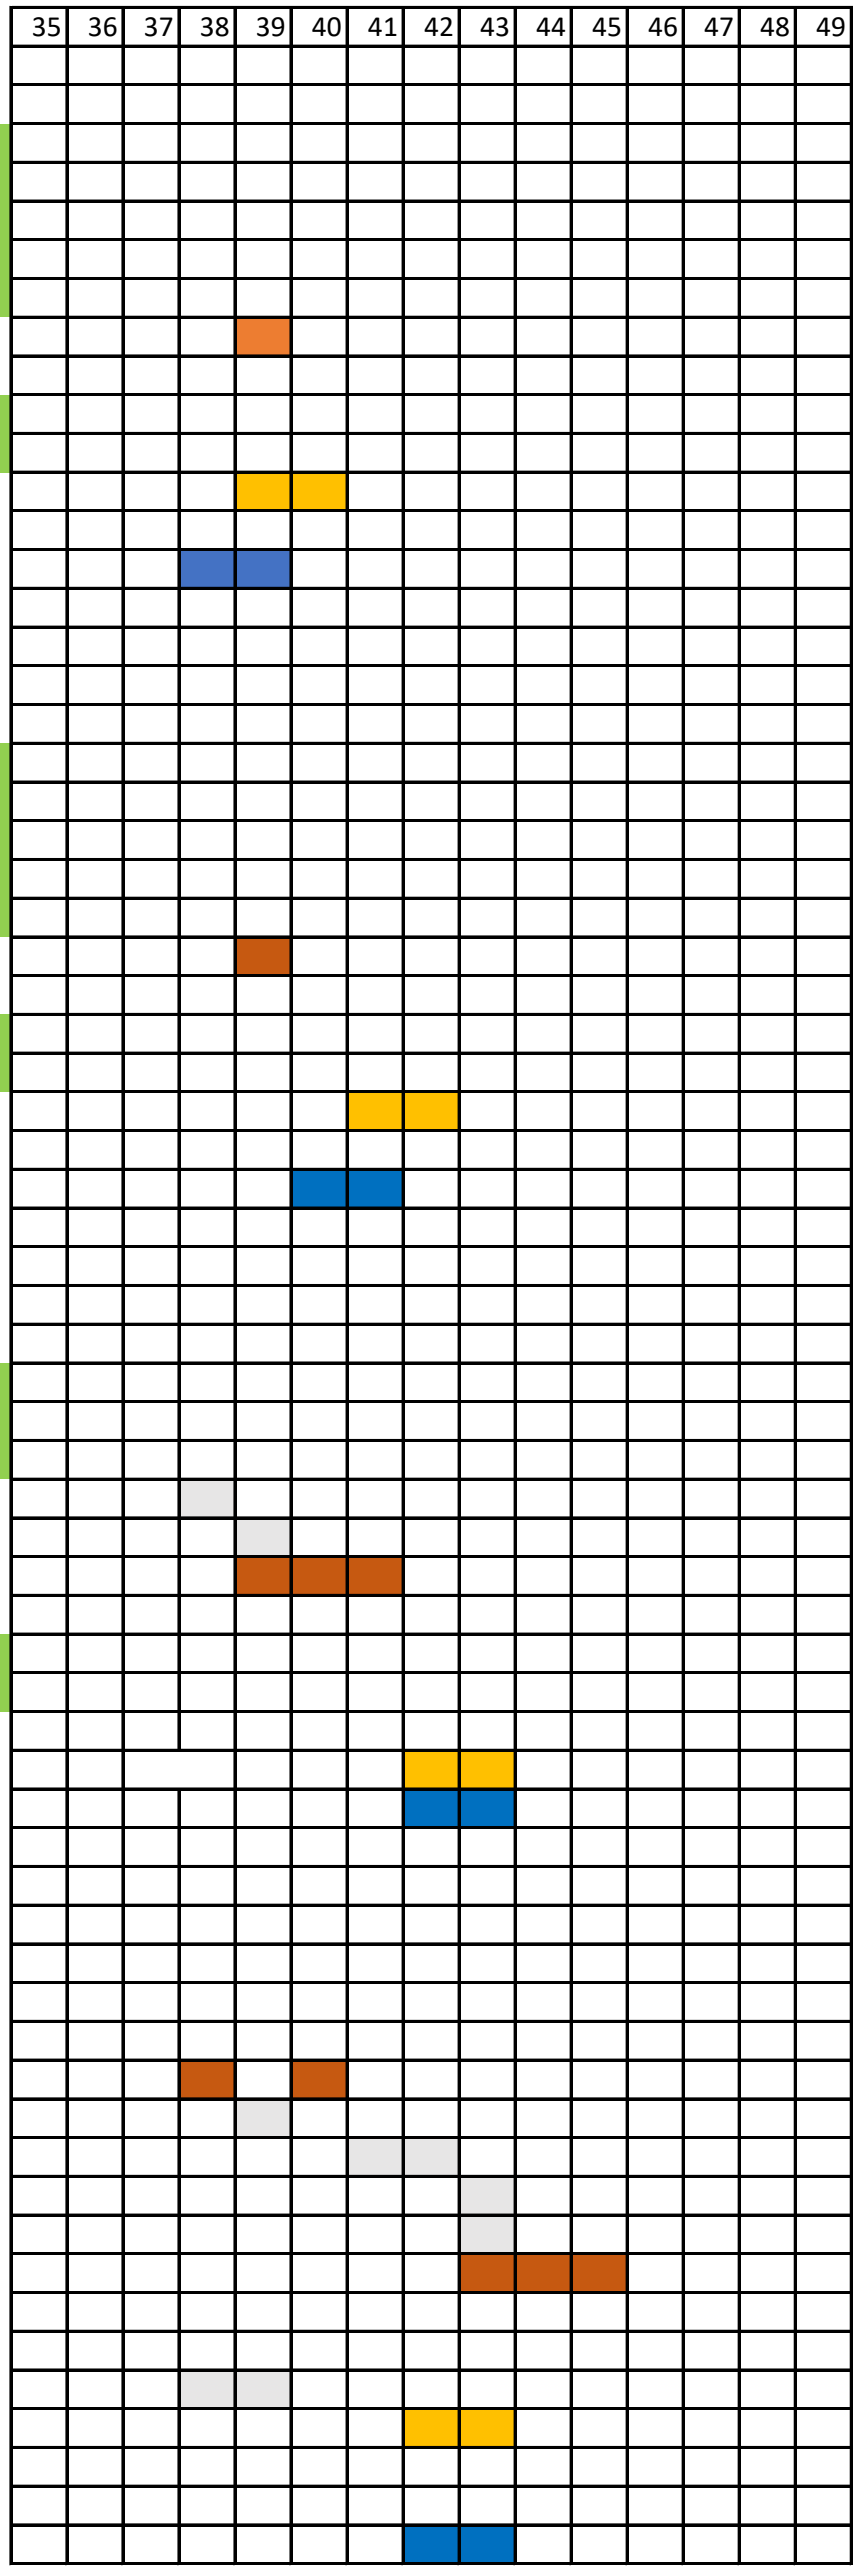
Aktivitet	Vecka
Hjortronvägen 89-115	
Etablering, TA-plan, avstängningar	
Schakt stamledning samt serviser	klart
Arbete vattenledning	klart
Rörarbeten VS, VV	klart
Muffning	klart
Inmätning	klart
Återfyllning VS/VV	Asfalt återstår
Håltagning till soprum/trapphus	klart
Rörarbeten i trapphus	klart
Inkopplingar i trapphus	
Arbeten i central Hjortronvägen 89-115	
Hjortronvägen 41-57	
Schakt och stamledning samt serviser	klart
Arbete vattebledning	klart
Rörarbeten VS,VV	Klart
Muffning	Klart
Inmätning	Klart
Återfyllning VS/VV	Asfalt återstår
Håltagning till soprum/trapphus	klart
Rörarbeten i trapphus	klart
Inkopplingar i trapphus	
Arbeten i central hjortronvägen 41-57	
Hjortronvägen 73-87	
Schakt och stamledning samt serviser	klart
Arbete vattebledning	klart
Rörarbeten VS,VV	klart
Muffning	pågår
Inmätning	
Återfyllning VS/VV	
Håltagning till soprum/trapphus	klart
Rörarbeten i trapphus	klart
Inkopplingar i trapphus	
Arbeten i central hjortronvägen 73-87	
Hjortronvägen 1-27	
Schakt och ledningsbädd stamledning	
Arbete vattebledning	
Rörarbeten VS,VV	
Muffning	
Inmätning	
Återfyllning VS/VV	
Håltagning till soprum/trapphus	
Rörarbeten i trapphus	
Inkopplingar i trapphus	
Arbeten i central Hjortronvägen 1-27
